山西雁门王酒业有限公司雁门关游客集散中心城墙酒店“4·24”一般触电事故调查报告

代县政府事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）项目情况 5
（三）事故发生经过 6
（四）事故现场情况 7
（五）死亡人员情况 8
（六）直接经济损失 8
二、事故应急处置情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）间接原因分析 10
四、对有关单位和人员存在主要问题的处理建议 11
（一）有关单位和人员存在主要问题 11
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 11
（三）有关监管部门 13
（四）地方党委政府 13
五、事故教训 13
（一）山西平乐消防工程有限公司贯彻落实安全发展理念不牢，源头把控失守 13
（二）山西平乐消防工程有限公司员工未严格落实岗位安全责任 14
（三）监管部门落实安全发展理念不牢，落实监管责任不力 14
六、事故整改和防范措施 14
（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线 14
（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平 15
（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力 15

2024年4月24日，山西平乐消防工程有限公司维修人员在山西雁门王酒业有限公司雁门关游客集散中心城墙酒店维修消防设施过程中发生触电事故。该起事故，造成一人死亡，直接经济损失115万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，要求全力做好事故处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关法律法规规定，代县人民政府成立由副县长任组长，县政府办公室、县委宣传部、县住建局、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、雁门关镇人民政府有关人员和专家组成的山西雁门王酒业有限公司雁门关游客集散中心城墙酒店“4·24”触电事故调查组，邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组介入开展工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实际”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的主要问题，提出了整改和防范建议措施。

经调查组认定，山西雁门王酒业有限公司雁门关游客集散中心城墙酒店“4·24”一般触电事故是一起因施工作业人员在对消防设施巡检维修作业时未有效辨识作业环境存在安全风险因素，在未断电的情况下盲目作业，不慎接触到漏电体被电击倒，

造成的1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.酒店运营单位概况

（1）酒店运营单位简介

山西雁门王酒业有限公司于2022年2月成立，注册地址代县雁门关镇南口村，注册资金1亿元，是代县县委、县政府引进成立的集酒制品生产、酒类经营、食品销售、农产品生产、销售、加工运输、储藏等于一体的综合性现代农业企业。

山西雁门王酒业有限公司以国家5A级景点雁门关景区为依托，在雁门关景区以南，新上集黄酒生产加工、历史文化展示、民宿旅游为一体的有机黄酒酒堡项目。项目总投资27亿元，主要建设黄酒文化体验区、黄酒生产加工区两大区域。

雁门关游客集散中心城墙酒堡用地面积9万平方米，建筑面积8.996万平方米，投资64645.29万元人民币。分东、西段城墙酒店，涉事西段城墙酒店于2023年10月建设完成，12月份家具陆续进场，为正常营业做准备。

（2）营业执照信息

山西雁门王酒业有限公司，法定代表人：张某斌；统一社会信用代码：91140100MA0LP6WP7G；成立日期：2022年2月25日；营业期限：2022年2月25日至2042年2月24日；注册地址：山西省忻州市代县生态文化旅游园区雁门关镇南口村；经营范围

的许可项目：酒制品生产；酒类经营；餐饮服务；食品销售；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：酒店管理；文化场馆管理服务；餐饮管理等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（3）项目备案证信息

山西雁门王酒业有限公司游客集散中心，项目法人：山西雁门王酒业有限公司；统一社会信用代码：91140100MA0LP6WP7G；建设地点：忻州市代县；建设性质：新建；项目单位经济类型：私营企业；计划开工时间：2022 年 5 月；项目总投资：64645 万元（其中自有资金 64645 万元，申请政府投资 0 万元，银行贷款 0 万元，其他 0 万元）；建设规模及内容：建设总用地面积为 90000 平方米的游客接散中心；建造总用地面积为 90000 平方米的游客接散中心分为四大区域：博物馆酒文化展示区，场景式民宿酒店区，黄酒主题文旅区，酒文化交流会议中心、管理办公区。

（4）土地许可证信息

权利人：山西雁门王酒业有限公司；山西省编号：BDC1409231202300112242，晋（2023）代县不动产权第DQ00048号；共有情况：单独所有；坐落：代县雁门关南口村；不动产单元号：140923204018GB00002W000000D；权利类型：国有建设用地使用权；权利性质：出让；用途：其他商服用地；面积：80737.8m^2；使用期限：国有建设用地使用权2023年2月9日起2063年2月8日止。

2.消防设施维保单位基本情况

（1）营业执照信息

山西平乐消防工程有限公司，法定代表人：刘某华；统一社会信用代码：91140900792247510U；成立日期：2006 年 9 月 21 日；营业期限：2006 年 9 月 21 日至 2088 年 8 月 8 日；注册地址：忻州市忻府区七一北路 98 号；经营范围：建设工程：消防设施工程专业承包（壹级）；消防技术服务：消防器材的销售、维修；消防技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：忻州市行政审批服务管理局。

（2）建筑业企业资质证书信息

资质类别及等级：消防设施工程专业承包壹级；注册资本：1100 万元人民币；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）有效期至：2024 年 12 月 31 日；发证机关：山西省住房和城乡建设厅。

（3）安全生产许可证信息

编号：（晋）JZ 安许证字[2023]000130；许可范围：建筑施工；有效期：2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日；发证机关：山西省住房和城乡建设厅。

（4）安全管理情况

山西平乐消防工程有限公司设立了安全生产管理机构，制定了安全施工文明现场管理标准。项目管理人员经业务主管部门考核合格，从业人员参加了工伤保险，施工现场从事危险作业人员

办理了意外伤害保险。

安全生产总负责人：刘某华；安全生产管理机构负责人：张某发；项目负责人：郭某琴、张某琴、罗某勇、贾某；专职安全管理员：白某峰、李某龙；安全员：闫某宇、刘某。

表 1 施工管理人员情况表

姓名	职务	职称
张某琴	项目负责人	一级建造师
郭某琴	技术负责人	一级建造师、造价师
陈某阳	现场负责人	
张某发	安全员	助工
张某芳	统计员	助工
闫某宇	施工员	助工
刘某飞	机械员	助工
白某	定额员	助工
白某某	资料员	助工
刘某某	质检员	助工
安某	预算员	助工

（二）项目情况

山西平乐消防工程有限公司与山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司于2023年4月17日签订了雁门关景区游客集散中心消防工程施工合同，山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司为该项目的出资方，施

工单位为山西平乐消防工程有限公司，工程内容为甲方提供的图纸及工程量清单所含的工程内容。（包括火灾报警系统、消防给水系统、消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火器系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、防火门、防火窗等涉及到室内室外的所有消防项目及本项目所需的检测内容）。2024年4月20日，山西平乐消防工程有限公司对西城墙酒店房间消防管道设施进行注水打压，对消防设施设备进行质保巡检维护。

（三）事故发生经过

2024年4月20日，山西平乐消防工程有限公司对西城墙酒店进行质保巡检维护时发现，A11号房间2层卫生间吊顶区域有两处消防管道漏水需要维修，4月24日，公司现场负责人陈某阳安排喷淋班组长范某进行维修作业，范某安排组员董某华和任某强2人进行维修，15时23分，董某华未执行断电验电程序的情况下，擅自打开A11号房间2层检修口（尺寸45×45cm）徒手攀爬进卫生间吊顶区域，在管道漏水处突然被电击倒，任某强发现异常后呼喊无回应，急忙从检修口处查看董某华状况，看到董某华躺倒无反应，立即下楼呼喊同事白某华、张某海过来帮忙，白某华到场后把所有电路电闸关闭，但因吊顶内空间狭窄无法直接施救，三人砸开卫生间吊顶，把董某华从上面抱下来，随后白某华开车三人拉上董某华于15时40分到雁桥医院进行医治，雁桥医院查验后建议去代县人民医院医治，15时45分三人拉上董某华离开雁桥医院，16时10分到达代县人民医院，经医生查验，

16 时 25 分宣布董某华死亡。

（四）事故现场情况

山西雁门王酒业有限公司游客集散中心城墙酒店A11号房间内床、沙发等家具已就位，基本具备使用功能，电器设施保险装置齐全，电器设施线路处于通电状态（220V），经现场实地勘察，事故发生房间，吊顶检修口方正，一人可通过作业，上人登高使用梯子结构牢靠。

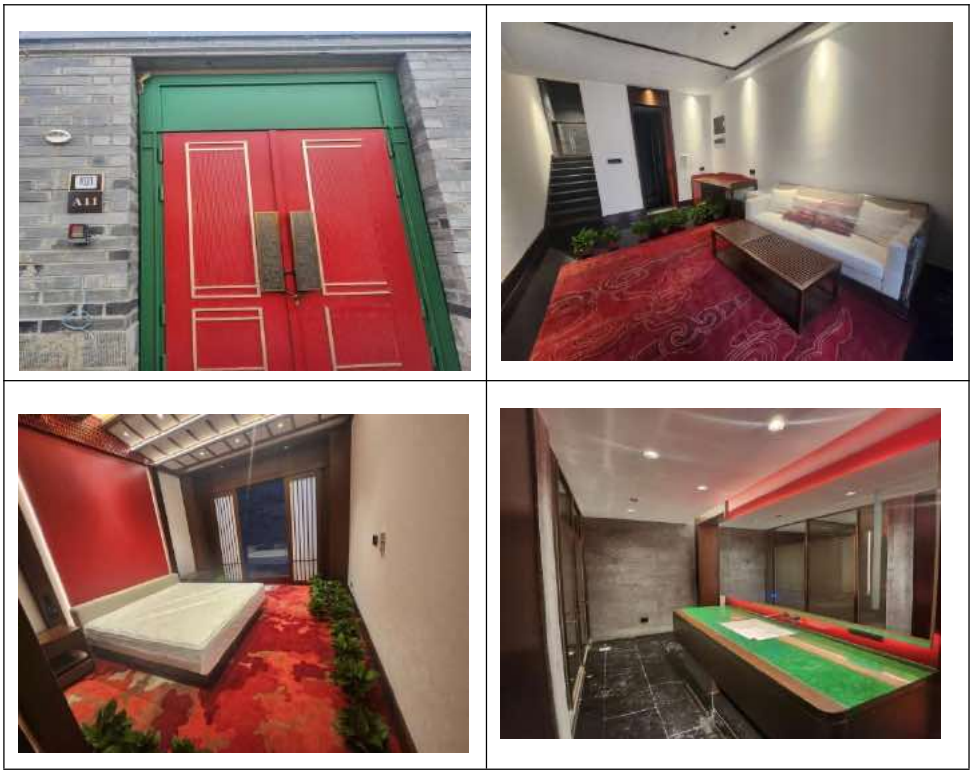


图 1 A11号房间一层、二层内部情况



图 2 A11号房间检修口及卫生间吊顶救人处

（五）死亡人员情况

董某华，男，1994年**月出生，山西省**市**区人，身份证号：1406021994********，生前系山西平乐消防工程有限公司山西雁门王酒业游客集散中心城墙酒店项目部工人。

（六）直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位上报情况

2024 年 4 月 24 日 16 时 40 分，山西雁门王酒业有限公司、山西平乐消防工程有限公司向雁门关镇政府报告事故发生情况，并按照镇领导要求上报雁门关镇派出所。17 时 00 分代县公安局雁门关派出所接到 110 指令，称辖区雁门王酒业有人被电击受伤在 120 急救。雁门关派出所民警接到指令后，赶往代县 120 急救中心，经核实，伤者董某华已在送往医院途中死亡。

2.属地应急部门接报情况

代县应急管理局值班室2024年4月24日值班记录:代县应急管理局值班室于2024年4月24日16时42分接到110指挥中心电话，告知有人被电击，正在医院抢救。值班人员于16时45分向局领导汇报,局领导立即安排分管领导及相关股室去往现场核实；17时17分，局领导向分管副县长汇报。然后分别于17时21分、17时22分、17时29分向县政府办、县委办、市应急局电话汇报。17时53分，接市应急局回访电话，并于18时06分传真上报至市应急局。18时33分，接市应急局回访电话；18时43分接110指挥中心回访电话。

（二）事故现场应急处置情况

2024年4月24日15时23分，事故发生后，山西平乐消防工程有限公司现场维修人员任某强呼喊作业人员董某华无回应，任某强到检修口看到董某华躺倒无反应后,立即下楼呼喊同事白某华、张某海过来帮忙救援，白某华到现场后把所有电路电闸关闭，然后三人砸开卫生间吊顶，把董某华从上面抱下来，随后白某华开车三人拉上董某华去雁桥医院进行医治,雁桥医院查验后建议去代县人民医院医治，到达代县人民医院后，经医生查验董某华已经死亡。

（三）医疗救治和善后情况

伤者经代县人民医院医护人员确认死亡，代县人民政府成立了山西雁门王酒业有限公司雁门关游客集散中心城墙酒店“4·24”触电事故善后组，对死者家属进行善后安抚工作。2024年4月28日，山西平乐消防工程有限公司与死者家属签订了《死亡赔偿协议书》，一次性进行赔偿。

（四）事故应急处置评估

该起事故发生后，山西雁门王酒业有限公司、山西平乐消防工程有限公司及时向雁门关镇政府报告事故发生情况，并上报雁门关镇派出所，在第一时间对伤者进行救援。本次事故雁门关镇政府应向代县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，而不是向乡镇派出所报告，该起事故上报环节存在部分问题，救援过程处置合理，应急救援责任基本落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

山西平乐消防工程有限公司作业人员董某华在对消防设施巡检维护作业时，未有效辨识作业环境存在安全风险因素，在未断电的情况下，盲目作业，不慎接触到漏电体被电击倒，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.山西平乐消防工程有限公司主体责任落实不到位，项目管理人员履职不到位，“安全生产、预防为主”的认识不深，分析辨识周围危险作业环境不到位。

2.山西平乐消防工程有限公司对从业人员的安全教育培训不深刻、安全技术交底制度不完善。

四、对有关单位和人员存在主要问题的处理建议

（一）有关单位和人员存在主要问题

1.事故单位

山西平乐消防工程有限公司在安排巡检维护作业时，未进行安全技术交底，未告知作业环境存在的的安全风险因素，巡检维护现场安全检查不到位，对事故的发生负有主体责任。

2.代县住房和城乡建设管理局

汲取代县古城雨污分流项目“8·6”一般坍塌事故教训不深刻，对全县房屋建筑和市政施工企业的安全监管、督促工作不到位；对山西雁门王酒业有限公司游客集散中心建设项目，落实监管责任不到位。

3.雁门关镇党委政府

履行安全生产属地管理职责不到位；与县级执法部门信息共享、联合调查等协调配合机制不完善。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.事故有关责任人员

（1）因在事故中死亡免予责任追究责任人员

董某华，男，1994年**月出生，山西省**市**区人，身份证号：1406021994********，生前系山西平乐消防工程有限公司山西雁门王酒业游客集散中心城墙酒店项目部工人。在对消防设施巡检维护作业时，未有效辨识作业环境存在安全风险因素，在未断电的情况下，盲目作业，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予责任追究。

（2）陈某阳，男，山西平乐消防工程有限公司现场负责人。未对从业人员进行全面的安全生产教育和培训，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[1]之规定，由县应急管理局对陈某阳处人民币3万元的罚款。

（3）刘某华，男，山西平乐消防工程有限公司法人代表，企业主体责任落实不到位，对事故的发生负领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]第一款之规定，由县应急管理局对刘某华处上一年年收入百分之四十的罚款。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》 第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.事故相关单位

山西平乐消防工程有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[3]、第四十四条[4]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]的规定，建议由代县应急管理局对山西平乐消防工程有限公司处以人民币50万元罚款的行政处罚。

（三）有关监管部门

建议代县住房和城乡建设管理局向代县人民政府作深刻检查。

（四）地方党委政府

建议雁门关镇党委政府向代县人民政府作深刻检查。

五、事故教训

（一）山西平乐消防工程有限公司贯彻落实安全发展理念不牢，源头把控失守。在安排巡检维护作业时，未进行安全技术交底，未告知作业环境存在的的安全风险因素，巡检维护现场安全检查不到位。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）山西平乐消防工程有限公司员工未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。山西平乐消防工程有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（三）监管部门落实安全发展理念不牢，执法部门信息共享、联合调查等协调配合机制不完善，对全县房屋建筑和市政施工企业的安全监管、督促工作不到位，汲取代县古城雨污分流项目“8·6”一般坍塌事故教训不深刻，对山西雁门王酒业有限公司游客集散中心建设项目，落实监管责任不力。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线

代县住房和城乡建设管理局、雁门关镇人民政府、山西雁门王酒业有限公司游客集散中心和山西平乐消防工程有限公司要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。时刻保持高度警惕，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治使命。要清醒认识现阶段安全生产形势与政策的严峻性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取“4·24”一般触电事故教训，举一反三，有效防范和化解各类安全生产风

险与事故，坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平

山西雁门王酒业有限公司游客集散中心和山西平乐消防工程有限公司要针对此次事故暴露出的问题，以问题为导向，全面开展反“三违”专项整治，进一步增强打击“三违”行为的力度，规范各类作业审批流程，对“三违”行为一律严查重处，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”，坚持反“三违”工作常抓不懈，把好每一道审批关口，狠抓审批责任落实，确实履行现场监管职责，防止出现监管缺位的空白区，切实做到“谁主管、谁监管、谁负责”。在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下真功夫。县住建局要督促辖区内建设施工单位落实安全生产主体责任，强化事故警示教育，向辖区内建设工地企业开展安全宣传活动，深入开展安全生产隐患排查整治行动，切实消除安全隐患，预防安全事故的发生。

（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力

山西平乐消防工程有限公司要举一反三，通过本次事故查找公司在安全生产管理中存在的问题，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要认真执行落实国家有关

的法律法规和行业标准，认真履行安全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要认真履行职责，落实执行安全生产法律法规及本公司安全管理制度，对违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为及时制止并处理，对工作中发现的生产安全事故隐患做到立查立改，防止生产安全事故的发生。
