【事故通报】定远县永恒粮贸有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-01-04 16:07　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2023年9月28日上午11时许，定远七里塘乡定远县永恒粮贸有限公司发生一起高处坠落事故,致1名作业人员死亡，直接经济损失85万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等29日，定远县政府成立了由县应急管理局主要负责人任组长、分管负责人任副组长，县公安局、住建局、发改委、总工会、人社局和七里塘乡组成的定远县永恒粮贸有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组，下设综合组、技术组、管理组、应急处置评估组）（签名名请县纪委监委派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和措施，形成了《定远县永恒粮贸有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查报告》及《应急处置评估报告》、《技术报告》、《管理报告》。

经调查认定，滁州定远县永恒粮贸有限公司“9·28”一般高处坠落事故是一起因登高作业未佩戴安全帽和系挂安全绳，违章冒险作业导致的责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及项目基本情况

1.公司概况。定远县永恒粮贸有限公司（以下简称：永恒粮贸）（地理位置见图1）,成立于2008年1月22日，公司统一社会信用代码：……任公司；现有股东为刘某某和其妻子谢某某。住所：安徽省滁州市定远县七里塘乡；法定代表人：刘某某；注册资本：壹佰万元整。经营范围米加工等，现有职工3名。持有食品安全生产许可证，有效期至2029年9月19日（公司总平面位置图见图2）。



图1公司地理位置图



图2 公司总平面图

2.建设项目概况：永恒粮贸烘干储备库项目位于七里塘乡孙集村街道路南，总占地面积9.9亩，总建筑面积3075平方米，规划拟建设1#平方米、2#粮食平房仓1152平方米、3#厂房702平方米和烘干房480平方米。2023年5月18日取得建设用地规划许可证（地字第.....）（证5279.23平方米）。2023年9月10日， 1#粮食平房仓土建工程发包给邓传结施工（自然人，2022年1月份取得砌筑工职业技能登记证，证号：...期完成土建，未办理施工许可。9月2日，刘某某将1#粮食平房仓钢构架设工程发包给张某某，钢构件由刘某某提供，张某某负责安装，工程造方米，当日双方签订了协议。9月26日，张某某雇佣2名工人（每天人员不固定）和吊车（驾驶员俞某某，特种作业证号：.....，有效期至2026地开始进行钢结构安装，至事发时已完成立柱、主梁和水槽施工，开始安装系杆。

3.事故涉及相关单位安全管理情况

（1）永恒粮贸。该公司日常生产经营和安全管理由刘某某负责，平时仅有2名工人，在需要收购或者加工大米时临时雇佣人员。刘某某人、安全管理员资格证。公司编制了《粮食加工安全生产管理体系安全生产操作规程》、《安全检查及消防培训规定》和《安全生产事故应急制度提供了今年以来安全隐患排查记录表和教育培训记录。

（2）七里塘乡人民政府。乡党委书记方某某，乡长孙某，乡党委委员、武装部长单某分管安全生产和救灾工作。该乡安全生产工作实行网格防安全、校园安全、公共卫生安全、商贸和食品安全、道路交通及供电、工业企业安全生产、危化品安全生产和建筑施工安全等8个工作组，并生产职责；乡包村干部和村（社区）主要负责人对本辖区安全生产负总责；重点企业由党政领导班子包保，永恒粮贸由乡党委书记方某某包保

为乡畜牧兽医站长邓某。

（3）定远县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”），性质：机关；机构地址：定远县永康路621号；负责人：吴某。其安全生产职责主地安全生产监督管理、建设工程特种设备安全监管、建设工程消防设计审查、城镇燃气安全监管等。

（4）定远县发展和改革委员会（公管局、粮储局）。性质：机关；机构地址：定远县幸福东路；负责人：吴某某。其安全生产职责主要有：全管理有关工作，负责监督管理电力设施和电能保护；负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查和督查工作；负责全县粮食流通、加工行业监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二）事故发生经过

9月28日早上7时许，俞某某驾驶吊车首先到达工地，随后张某某带领魏某某一起到1#粮食平房施工现场。俞某某吊运钢构件，魏某某负张某某则通过立柱徒手攀爬到厂房上面负责定位并固定钢构件。当日上午首先从1#粮食平房东南边开始施工。11时许，开始安装西南角最后一根某某站在高度约9米的钢构顶棚水槽上安装系杆与钢梁连接部位时，因系杆与钢梁螺栓连接部位错位，需校正钢梁预留孔洞，张某某在使用撬棍行校正时，水槽（长约7米，宽约0.25米，重约300公斤的槽钢）偏位滑脱，造成站在钢构顶棚水槽上的张某某随之失稳坠落，导致高坠事故发生

图3 滑脱的水槽及死者坠落地点

（三）事故现场情况

事故发生在1#粮食平房仓西南角，该厂房实际长36米，宽23米，高9.3米，建筑面积828 m^2，为钢结构。东侧为空地，规划建设3#厂房离院墙约2米，北侧靠西位置是原生产车间，拟规划建设烘干房，正北侧现为空地（见图4、图5）。

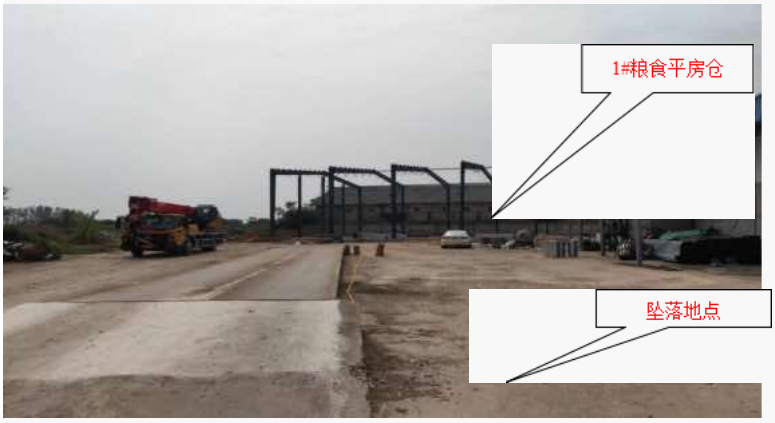


图4建设项目总体现状



图5 1#粮食平房仓建设现状

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，无人员受伤。

张某某，男，自然人，现年51岁，身份证号：略，系定远县炉桥镇七里社区严北组人，无登高作业证。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，此次事故直接经济损失约85万元。

（五）天气情况

9月28日，定远县天气多云，白天最高气温25℃，夜间最低温度19℃，东北风，风力:2-3级，风速:3.4-5.4m/s。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，现场人员俞某某立刻打电话给刘某某妻子谢某某，告知发生了坠落事故。谢某某到现场后立刻拨打120急救电话，魏某某也赶
均发现张某某坠地后不能动弹。约30分钟后，县盐化医院120急救车辆赶到现场，经医生现场检查确认张某某已经死亡。11时35分，刘某某拨
话，七里塘乡派出所在接到报警后立即出警，并封锁了现场，同时将从外地赶回的刘某某以及现场目击者魏某某、俞某某带至派出所进行了书面

14时51分，乡派出所在初步调查问询后，排除刑事犯罪的可能，初步判定为安全生产事故，随即向七里塘乡政府通报了事故情况。

16时18分，定远县应急管理局接七里塘乡政府报告。

17时10分，定远县应急管理局向市应急管理局报告了事故信息，同时上报了县政府办和县委办。

（二）应急处置情况

接到派出所事故通报后，七里塘乡党委政府主要负责人第一时间赶赴现场，并成立善后工作组，全力做好死者家属安抚，维护社会稳定。
县委县政府高度重视，指派副县长马某带领县公安、应急和住建等部门负责人赶赴七里塘乡指导事故应急处置工作。10月9日，刘某某与死者
议，善后赔偿工作基本结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后七里塘乡主要领导第一时间赶赴现场，并成立专班安抚死者亲属，协调善后赔偿事宜。县政府负责人在第一时间组织应急、住
场指导事故应急处置工作。县政府通过及时正面发声、正向引导、还原事实，强化舆论引导，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，截至目
稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张某某在安装钢构配件过程中，未按规定搭设牢固、安全的施工作业平台或使用规范的自升降式操作平台、起重吊装机械，且未佩戴安全
本安全防护用品，违章冒险作业是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.永恒粮贸安全生产主体责任不落实。违规将钢构厂房安装发包给不具备资质的自然人，未签订专门安全管理协议；未将外包项目安全生
管理；作业现场安全管理缺失，未能及时发现和制止施工人员违规作业行为。

2.现场施工钢构安装作业人员未经专业培训、三级安全教育、安全技术交底等措施且无特种作业人员上岗证，就盲目进场施工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

1.未办理施工许可证擅自开工建设。

2.未按照规划许可建设。1#粮食平房仓规划设计480m^2，南侧和东侧均留有消防通道，实际建设时擅自将厂房扩大，占用消防通道。

3.未将外包项目安全生产纳入统一管理。一是不查验施工方资质证件；二是未督促施工方编制钢结构施工组织方案；三是未对进场施工人
培训；四是作业现场安全管理缺失，未能及时发现和制止施工人员违规冒险作业行为。

4.该公司安全管理制度和岗位操作规程与本企业实际不符；安全管理制度不落实，如安全教育培训登记表签名字体雷同，今年以来隐患排
等。

（二）地方政府及相关部门、单位存在的问题

1.七里塘乡人民政府落实属地安全管理职责不到位。对永恒粮贸未办理施工许可擅自开工建设未能及时发现并制止。落实全县第四次安委
办转发的《滁州市安委会办公室关于切实做好中秋国庆期间安全防范工作的通知》（滁安办明电〔2023〕 8号）不到位。

2.县住建局未认真履行行业监管职责，指导督促各乡镇（园区）开展建筑施工领域安全生产专项整治不力。

3.定远县发改委未认真履行行业安全监管职责，没有对永恒粮贸开展过安全监督检查。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）建议不追究责任人员

张某某，钢结构厂房安装承包人，安全意识淡薄，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.方某某，男，中共党员，定远县七里塘乡党委书记，永恒粮贸公司安全生产包保责任人。对该公司未办理施工许可擅自开工建设未能及时对事故的发生负有重要领导责任，建议给予提醒谈话处理。

2.单某，男，中共党员，定远县七里塘乡党委委员，武装部部长，分管安全生产和应急管理工作。未组织开展节前安全生产大检查，落实会精神及县安委办转发的《滁州市安委会办公室关于切实做好中秋国庆期间安全防范工作的通知》（滁安办明电〔2023〕 8号）不到位。对事故负责任，建议责成其向七里塘乡党委政府作出深刻书面检查。

3.邓某，男，中共党员，定远县七里塘乡畜牧兽医站长，孙集村包村干部，根据乡政府安全生产网格化管理规定，负责该村各行业领域安全本辖区内安全生产巡查检查不到位，对事故的发生负有直接领导责任，建议给予诫勉谈话。

4.袁某某，女，中共党员，县住建局党组成员，分管建筑施工，未能正确履行职责，对事故发生负有领导责任，建议责成其向住建局作出深

5.陈某，男，中共党员，县发改委副主任，分管粮食产业化建设，粮食安全考核和粮食行业监督检查等。未认真履行行业安全监管职责，落实安全生产主体责任不力。建议责成其向县发改委作出深刻书面检查。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.刘某某，男，57岁，定远县永恒粮贸有限公司主要负责人，法定代表人，全面负责公司日常管理工作，安全生产第一责任人。未认真履行职责，未建立健全并落实本单位安全管理制度和操作规程；未将外包建设工程项目安全生产工作纳入统一管理，未对进场施工人员进行安全教育时发现并制止违章冒险作业，对事故的发生负有重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（二）（五）项等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议对其处上一年年收入5万元的40%罚款，计2万元整。鉴于其能积极主动配合政府做好事故善后工作，得到死者亲属谅解，不再追究其他法律责任。

2.定远县永恒粮贸有限公司，未能认真履行法定安全生产主体责任。违规将钢构厂房安装发包给不具备资质的自然人，未办理施工许可证；未将外包建设工程项目安全生产工作纳入统一管理。安全管理制度和岗位操作规程与本企业实际不符，安全教育培训和隐患排查治理流于形式，负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条第二款、第四十九条第一、二款以及《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，鉴于其能积极主动配合政府做好事故善后工作，得到死者亲属谅解，建议对其从轻处罚，处以叁拾万元（30万元）的罚款。

（四）其他处理建议

建议七里塘乡党委政府向县委县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施：

（一）定远县永恒粮贸有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制；认真修订完善安全岗位操作规程；做好安全生产教育培训工作，严格落实“三级”安全教育培训；要构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并严格执行建设工程项目安全生产工作纳入公司统一管理，定期开展安全检查，发现安全隐患、问题的，应当及时督促整改。加大安全生产投入和作业现度，开展全方位、无死角、全覆盖的安全隐患大排查、大整改，制定隐患问题清单和整改措施清单，及时整改完善。

（二）七里塘乡人民政府要加大对辖区内企业的安全监管力度，及时开展事故警示通报，督促其他企业认真吸取事故教训，举一反三，“一故，万厂受教育”；要督促企业健全安全生产领导机构、管理机构，配备安全生产管理人员，确保先安全，后生产，建立健全并落实安全生产全生产教育培训工作，增强职工安全意识和自我防范能力，杜绝职工“三违”行为。切实维护人民群众生命财产安全，真正担负起“促一方安”的政治责任。在做好监管的同时，帮助企业尽快完善相关手续，合法生产和建设。

（三）县住建局、发改委等有关部门要牢固树立安全发展的理念，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”步强化行业监督职责，督促企业坚守红线意识和底线思维，认真开展隐患排查治理，实行隐患排查治理闭环管理；要从严依法办理各项许可项督检查，加大打击安全生产非法违法行为的力度，确保各项规定和管控措施落实落细落到位。

扫一扫在手机打开当前页

